


abr-24	
01/04/2024	DÍA NO LABORABLE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN -- LLUVIA
02/04/2024	NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
03/04/2024	NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
04/04/2024	NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
05/04/2024	NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
06/04/2024	
07/04/2024	
08/04/2024	LLUVIA - NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
09/04/2024	NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
10/04/2024	NO SE PUEDE TRABAJAR EN LA TRAZA POR HUMEDAD
11/04/2024	RECOMPACTACIÓN EJES 2, 8, 9 GLORIETA OESTE
12/04/2024	RECOMPACTACIÓN EJES 2, 8, 9 GLORIETA OESTE
13/04/2024	
14/04/2024	
15/04/2024	ADECUADO GLORIETA OESTE SUR, RIPADO EJE 2, ENSANCHE M823 LADO ESTE
16/04/2024	ADECUADO GLORIETA OESTE SUR Y EJE 8
17/04/2024	ADECUADO GLORIETA OESTE SUR Y EJES 7 Y 8. ESTABILIZADO EJE 9, ENSANCHE M823 LADO ESTE
18/04/2024	ESTABILIZADO GLORIETA OESTE Y EJE 9, TERRAPLENADO EJE 2
19/04/2024	ESTABILIZADO GLORIETA OESTE Y EJE 9, TERRAPLENADO EJE 2. LEVANTADO CAPA EJES 7 Y 8
20/04/2024	REFINO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GLORIETA OESTE, EJE 9 Y EJE 2
21/04/2024	
22/04/2024	TERRAPLENADO EJE 2. REFINO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EJES 7 Y 8
23/04/2024	TERRAPLENADO Y DESMONTE EJE 2. ADECUADO EJES 7 Y 8, RETIRO BIONDA Y CAJEADO PARA ESTABILIZADO GLORIETA OESTE, RELLENO ENSANCHE GLORIETA ESTE
24/04/2024	ADECUADO EJES 7 Y 8, RETIRO BIONDA Y CAJEADO PARA ESTABILIZADO GLORIETA OESTE
25/04/2024	ADECUADO EJES 7 Y 8. RELLENO INTERIOR GLORIETA OESTE
26/04/2024	EXCAVACIÓN ZANJA Y HORMIGÓN BASE ODT 0.8 E2. ADECUADO EJES 7 Y 8, RELLENO EJE 2
27/04/2024	
28/04/2024	
29/04/2024	COLOCACIÓN TUBOS ODT 0.8 E2. ESTABILIZADO EJES 7 Y 8, RELLENO EJE 2. SANEO ENSANCHE GLORIETA ESTE. PRECIPITACIONES POR LA TARDE
30/04/2024	RELLENO EJE 2, TÍMPANO EMBOCADURA Y RELLENO LOCALIZADO ODT 0.8 E2. ESTABILIZADO EJE 9

abr-24						
L	M	X	J	V	S	D
 1	 2	 3	 4	 5	6	7
 8	 9	 10	 11	 12	13	14
 15	 16	 17	 18	 19	 20	21
 22	 23	 24	 25	 26	 27	28
 29	 30					

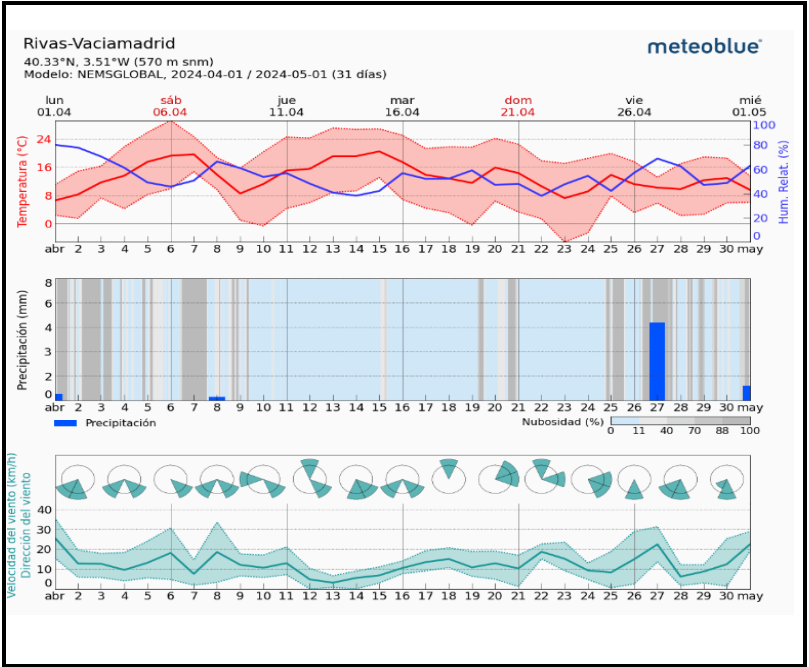

DÍAS LABORABLES		DÍAS TRABAJADOS		DÍAS DE LLUVIA (LABORABLES)		DÍAS NO TRABAJADOS EN EJES POR LLUVIAS O CONDICIONES DE HUMEDAD		DÍAS TRABAJADOS EN EJES: (MOVIMIENTO TIERRAS EXPLANADA)	
	22/30		15/22		2/22		7/22		15/22
